



León, Gto., a 13 de diciembre de 2021 Oficio: DGOP/3123/2021 Asunto: Evaluación 1ro y 2do trimestre

LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal Presente.

15 DIC 2021 PH1:28 REGIBIDO CONTRALORIA 718 C/aneko

Ing. Israel Martínez Martínez en mi carácter de Director General de Obra Pública del Municipio de León, Guanajuato, con fundamento en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII,XI, XV, XVI, XXXVIII y 180 primer párrafo, fracciones I, XI, XII y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente, en atención al oficio CM/CESCI/5750/2021, mediante el cual dio a conocer las observaciones y aspectos susceptibles de mejora, derivado de la evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia en el logro de objetivos y metas, correspondiente al periodo enero-junio 2021, me permito informarle lo siguiente:

Con respecto a la recomendación 1.

En cuanto a los recursos no comprometidos ni ejercidos, al cierre semestral, le comento lo siguiente:

Del programa K100213 de muévete por León que al cierre de junio se tenía un monto sin comprometer ni ejercer de \$137,674,431.80 que representaba un 58% del recurso asignado, parte de las obras de pavimentaciones a realizar fue con concurrencia estatal, por lo era necesario la firma del anexo de ejecución, así como el reconocimiento del recurso, el cual fue reconocido en la modificación del mes de septiembre. A la fecha se han realizado todas las contrataciones y solamente se tiene en la cuenta economías de licitaciones.

Del programa K100202 de Alumbra León, se llevó a cabo las contrataciones necesarias para cumplir con la meta programada. La economía de 33 millones correspondiente a la 5ta etapa del alumbrado público, se puso a disposición en la 6ta modificación al programa de inversión de fecha 08 de julio, el cual fue reasignado para otros programas prioritarios.

Del programa **K100209** de mantenimiento Integral, que al cierre del semestre presentó un monto de 32 millones de pesos sin comprometer ni ejercer, le comento que en la 4ta modificación al programa de inversión se asignó 20 millones para la rehabilitación del blvd. Juan Alonso de Torres cuya obra por el monto se sometió a los tiempos de la licitación pública nacional.

Del programa **E100238** de Sistema de parques, se asignó la cantidad de 20 millones en la 4ta modificación, las contrataciones fueron realizadas en julio.

En cuanto a los programas, ampliaciones y escalatorias, supervisión externa y remediaciones, son programas cuyo ejercicio del gasto va en relación con las obras contratadas y de acuerdo a las necesidades de las mismas.

Om





Del programa K100194 de proyectos ejecutivos diversos, se trabaja en conjunto con la dirección de Inversión Pública, para dar prioridad a proyectos ejecutivos que abonen al programa de gobierno y de los cuales se podrá contar con recurso para la ejecución de las obras, así mismo también se realiza un estudio de factibilidad de las obras.

Aunado a lo anterior mencionado y como parte de las acciones preventivas para garantizar las contrataciones de la obra, se lleva un control del recurso asignado y recurso contratado del programa de inversión no solo de nuestra unidad responsable, sino de las diferentes unidades administrativas, el cual es revisado por la dirección general, la dirección de costos y presupuestos, la dirección de planeación y proyectos, la subdirección general de ejecución de obra y mantenimiento, la dirección de supervisión y la dirección de administración y control financiero de obra, lo anterior para monitorear avances de contrataciones y tomar las medidas necesarias para el correcto ejercicio del gasto. Este reporte es visto en junta de directores por lo menos dos veces al mes. (anexo 1)

Así mismo al cierre de las obras, se realiza la solicitud de cancelación de saldos de los contratos ya finiquitados y pagados dirigida a la dirección de egresos, con el fin de liberar del comprometido las economías de las obras para que a su vez la Dirección de Inversión Pública pueda reasignar los recursos a proyectos que abonen al programa de gobierno. (anexo 2).

Con respecto a la observación.

En relación al logro de objetivos y metas donde solicitó informar las razones por las cuales no se alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 80%, se anexa documento con los comentarios respectivos del avance de cada indicador (anexo 3).

Sin otro asunto al respecto, me despido y quedo a sus órdenes por cualquier duda y no omito mencionar que por parte de la Dirección de Obra Pública se ratifica la total disposición de coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente

"El Trabajo Todo lo Vence"

"2021, Año de la Independencia"


ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

/ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

I'CAL / A'LEBG

ANEXO I

REPORTE DE SALDOS DISPONIBLES PARA CONTRATACION

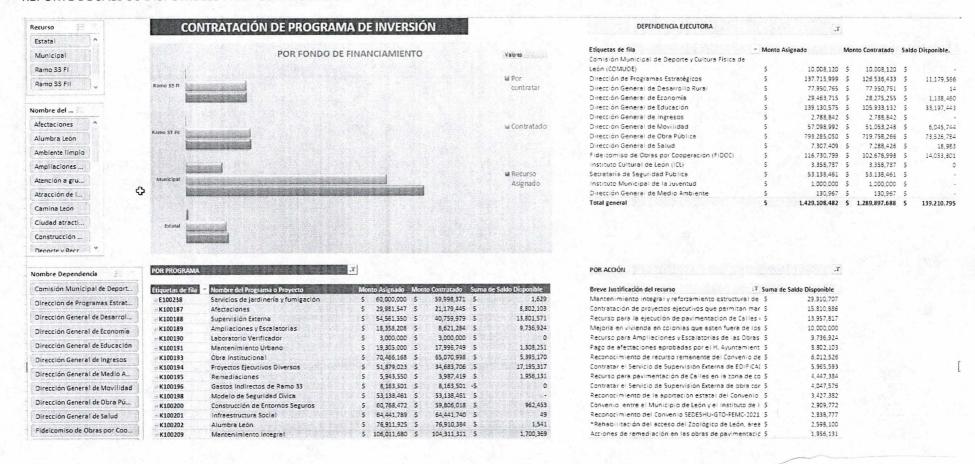

128,382,319.42 \$ 1,429,108,482.23 \$ 1,789,897,687.62 \$ 139,210,794.61

Up	Nombre Dependenc v	Número de Proyect	Nombre del Programa o Proyecto	Actividad	Acción Estratégica de acuerdo a Programa de Gobierno (Meta Trianual)	Breve justificación y/o descripción del Proyecto o Programa	Orige	Descripcion del Origen	11va Modificacion	Total Asignado	Contratado	Saldo Disponible
1314	Dirección General de Ingresos	K100193	Obra Institucional	868	Acción Estratégica Complementaria. Realitar acciones de obra institucional	Ejecución de la 2da, etapa del Proyecto de Restauración del inmueble donde se utican las oficinas de la Dirección General de Ingresos, en calle 5 de mayo Zona centro, León Gto. (problema de humedad)	12AB01	Participaciones 2020		\$ 2,788,842.45	5 2,788,842.45	s .
1510	Secretaría de Seguridad Pública	K100198	Modelo de Seguridad Cívica	A06	Construir el Centro de Seguridad Pública para ampliar la presencia y la cobertura de los servicios de seguridad en el poniente de la ciudad.	Recurso para la primera etapa de la obra de construcción del Centro de Seguridad Pública, además de los proyectos ejecutivos de las etapas 2 y 3, en las que esta dividido el proyecto de la delegación sur.	12AB01	Perticipationes 2020		\$ 53,138,461.00	5 53,138,461.00	S -
1810	Dirección General de Desarrollo Rural	K100201	infraestructura Social	A28	Implementar el programa de electrificación en 15 comunidades.	Alumbrado Público en Comunidades rurales: Puerta del Cerro, la Laborcita, Hacienda Artisò, San Carlos La Roncha, San Francisco del Durán, Losa de los Padres (zona ZAP), San Pedro del Monte, Los Arcos, El Ramilleta, La Pasiña, La Cinta, Barretca, Santa Rosa Plan de Ayala, Corral de Pladra, Malagaria y Granjas Económicas.	21AB01	FISM	-6,030,65	\$ 4,841,201.22	5 4,841,201,22	s
1810	Dirección General de Desarrollo Rural	K100201	Infraestructura Social	A29	Resilizar obras de pavimentación, revestimiento y mantenimiento mediante 70 acciones en comunidades rurales.	Rehabilitación de Stramos de caminos de acceso de competencia de Rally 2021: Ramai el Zauco, ibarrilla-Agua Zarca, Ojo de Agua- Ramai El Gigante, Aramai El Gigante, Aféro-Llano Grande, San Juan de Otates-Fresa de Otates, Duarte-Campilla-Las Coloradas entronque Mangas de la Estancia y Acceso a Autódromo.	21AB01	FISM	-0.23	S 3,149,999.67	5 3,149,999.67	s .
1810	Dirección General de Desarrollo Rural	K190201	Infraestructura Social	A29	Reslizar obras de pavimentación, revestimiento y mantenimiento mediante 70 accionas en comunidades rurales.	Complemento de Convenio con Eell SDAyR, para revestimiento de 23 Caminos Burales y 9 Caminos Socreosecha en la zona rural en Concurrencia 3514 Municipio 57,691,616 y 55% Estatas 13 14,264,490 Revestimiento de caminos rurales a beneficiar a 13 comunidades : San José de Otaras Norra, San Rafael Carro Verda, Campo Verda, Plunicipal Cuerta Blanca, San José de Otatas Sur, Las Coloradas, Loza de los Padras, Rincio Grande, San José de do los Sapos (Saccosecha), Estancia de la Sandía, Estancia de Vaqueros y El Derramadero	12AB01 11AA01	Participaciones 2020 Municipal		5 17,770,659.74	S 17,770,659.74	s .
1810	Dirección General de Desarrollo Rural	K190201	Infraestructura Social	A29	Realizar obras de pavimentación, revestimiento y manzenimiento mediante 70 actiones en comunidades rurales.	Reconocimiento de la aportación estatal del Convenio SARRIASR/DGDAR/CAMINO RUFAL/LEON/2021/9649 celebrado con la Sacretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural pare la Rehabilitación de 32 caminos rurales, revestimiento de 23 Estatal Caminos Rurales y 9 Cáminos Sacroscha en la zona rural con la siguiente estructura financiare.	31FB01	Programa Conectando Mi Camino Rural		S 14,284,430.28	5 14,284,430.27	S 0.01
1810	Dirección General de Desarrollo Rural	K100201	Infraestructura Social	A29	Reslizar obras de pavimentación, revestimiento y manterimiento mediante 70 a colones en comunidades rurales.	Mejoramiento de S Caminos rurales en Coparticipación con (SDAyR); en comunidades: La Sandia, El Terrero, Lagunillas, Vaquerias, San Antonio de Padus, Durate (Lona ZAP), Hacianda Arriba y Loza de los Padres (Cona ZAP). Concurrencia 50H Municipio y 50H Estaval Rehabilitación de caminos acacosecha en comunidades: Estancia de la Sandia, Rancho Nuevo la Luz. Miguel Hidalgo II (2 tramos) y Barretos. Concurrencia 50H Municipio (Nocurrencia 50H Estaval	21AB01	FISM		\$ 7,008,885.08	S 7,008,885.08	\$

EJEMPLO DE OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SALDOS





León, Gto., 02 de diciembre del 2021 DGOP/DAyCFO/2397/21

M.C.G. Y C.P.C. MA. NÉLIDA RÍOS JÁUREGUI DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez solicitarle que se apliquen las cancelaciones de saldos de los contratos, correspondientes, al·listado anexo.

Las anteriores cancelaciones obedecen a que los contratos se encuentran debidamente finiquitados.

Sin otro asunto al respecto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado.

A T E N T A M E N T E

"EL TRABAJO TODO LO VENCE"

"2021, Año de la Independencia"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

c.c.p./Arghivo

C.C. CA. VICTORIA GABRIELA ALVIZO.-DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA.-CONOCIMIENTO

1		
-1	7	
3		1
- 1		5

COMPRA	NO. CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
7841	RICE-151021	BISICO SA DE CV	121.8
7832	RICDSUP-136021	CONSTRUCTORA GASCAP SA DE CV	70,379.6
7718	RHED-076021	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL BAJIO,S A DE C.V	1.9
7894	RICESUP-159021	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	2.7
7723	RICE-086021	KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV	3,726.9
7735	RICE-099021	OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	384.0
7696	RICD-063021	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA SA DE CV	185,044.8
7722	RICD-104021	DE CV LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE	7,227.5
7868	RICE-158021	CV	0.1
7821	RICE-144021	CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO SA DE CV	0.1
7818	RICD-137021	CONSTRUCTORA COIBSA SA DE CV	118,155.7
7811	RICESUP-119021	PEREZ CABRERA MARGARITA	344.4
7785	RICESUP-099021	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	19.2
8128	AE-318021	ACQUA CONSULTA SA DE CV	2,152.5
7867	RICE-159021	CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	38.9
8319	AH-387021	CONSTRUCTORA MADACO S DE RL DE CV	40,462.0
7289	AE-189020	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL SA DE CV	154,526.5
8023	AH-229021	GUERRA GUERRA JUAN MANUEL	528.9
8269	AD-364021	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV	583.9
7603	AD-020021	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	18.8
7001	AH-442020	DIAZ VARGAS JOSE DE JESUS	87,268.2
7968	ADSUP-189021	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA SA DE CV	468.5
7566	AE-051021	ZERMEÑO MENDEZ SALVADOR	0.4
7546	AE1-430190	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	234,168.5
7504	AEZ-430190	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	158,799.3
7978	ADSUP-185021	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	464.9
7604	AD-019021	ARSA CONSTRUYE SA DE CV	39.7
7409	AD-443180	ACQUA CONSULTA SA DE CV	114,277.5
7727	RICE-091021	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	7,000.7
7844	RICE-150021	INMOBILIARIA DIMARI S A DE C V	48,286.5
7747	RICE-120021	BISICO SA DE CV	6.2
7831	RICDSUP-138021	MAURICIO JAIME TORRES	39,229.3
7873	RICD-168021	CONSTRUCMAGNUM S A DE C V	5.4
7821	RICE-144021	CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO SA DE CV	0.1
7599	GD-006021	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG SA DE CV	2,350,552.0
8045	RICO-244021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE S.A. DE C.V.	151,209.9
7738	RICE-102021	ARTURO ALCALA CORTES	6.4
A STATE OF BEING THE RESIDENCE	Company of the Compan	TOTAL	3,775,605.8





ANEXO III

NO PROYECTO	PROYECTO	MIR	INDICADOR	CVE. ACCIÓN	L ACCIÓN VINCULADA				JUSTIFICACIÓN				
M000001	Dirección de Obra Pública	Componente	de las vialidades para garantizar la seguridad de los usuarios.			50.00%	23.00%	46%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Se realiza la reparación de la vialidad	50.00%	23.00%	46%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	El supervisor determina y programa las actividades a realizar para el mejoramiento de la vialidad.	50.00%	0.00%	0%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte telefónico, programa 072, gerencias administrativas.	50.00%	11.00%	23%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	para que la ciudadanía tenga un decoroso acceso a sus viviendas			50.00%	34.00%	67%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Se realiza la conformación mediante maquinaria pesada y colocación de material inerte	50.00%	2530.00%	5063%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	Determinación y programación por el supervisor de las actividades a realizar para el mejoramiento de la vialidad	50.00%	0.00%	0%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte en el sac, medios de comunicación y de prensa, programa 072, vía telefónica.	50.00%	14.00%	27%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Espacios públicos con rehabilitación y mantenimiento			50.00%	17.00%	33%	De manera interna se dió seguimiento a las m programadas, sin embargo, debido al cambio del sistema captura de avance del PBR y la organización interna, la cap de este programa se dió de forma involuntaria en la ver anterior. Cabe señalar que al día de hoy el avance ya actualizado en el sistema vigente.				
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Se ejecutan las acciones de mantenimiento y/o rehabilitación	50.00%	0.00%	0%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	Realización de visita del supervisor al parque o espacio público para determinar la viabilidad de la intervención	50.00%	0.00%	0%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte en el sac, medios de comunicación y de prensa, programa 072, vía telefónica.	50.00%	11.00%	23%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Rehabilitación de la señalética en las vialidades municipales			50.00%	17.00%	33%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Colocación de señalética necesaria	50.00%	22.00%	44%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al	ACT-2	Visita y diagnostico a la zona solicitada para verificar la viabilidad de intervención con la señalética	50.00%	22.00%	44%					
M000001	Dirección de Obra Pública		Porcentaje monto del objetivo respecto al	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte en el sac, medios de comunicación y de prensa, programa 072, vía telefónica.	50.00%	11.00%	23%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	instalaciones de alumbrado en un plazo de 3 días			50.00%	16.00%	33%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Rehabilitación y mantenimiento al alumbrado publico en base a la petición	50.00%	16.00%	33%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	Elaboración de programa de acciones a ejecutar en la zona solicitada	50.00%	16.00%	33%					
M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte en el sac, medios de comunicación y de prensa, programa 072, vía telefónica.	50.00%	16.00%	33%					
100191	Mantenimiento Urbano	Actividad	Porcentaje de avance en el pago de contratos de mantenimiento urbano	B66-1	Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de mantenimiento urbano	0.00%	100.00%	0%	Por acuerdo de Gabinete se instruyó a iniciar los trabajos (c el recurso autorizado) en el primer semestre del año.				
			Porcentaje de avance en el mantenimiento				50.00%	0%	De manera involuntaria, se capturó un avance cuando deb de ser 0, ya que no tiene recurso asignado. No se rec corrección en virtud de que el sistema no lo permite.				
	M000001 M000001	Dirección de Obra Pública Dire	M000001 Pública Actividad Dirección de Obra M000001 Pública Actividad	Dirección de Obra Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso M000001 Pública Actividad Proceso Dirección de Obra Pública Activ	Dirección de Obra Pública Componente los usuarios. Porcentaje monto del objetivo respecto al Pública Actividad proceso ACT-1	M000001 Pública Componente Ios usularios. Componente Ios usuarios. Componente Ios usuarios. Componente Ios usuarios. Porcección de Obra Pública Actividad proceso Porcección de Obra Pública Actividad proceso Porcección de Obra Pública Actividad proceso Porcección de Obra Poblica Porcección de Obra Poblica Actividad proceso Porcección de Obra Poblica Actividad proceso Porcección de Obra Poblica Actividad proceso Porcección de Obra Poblica Poblica Actividad proceso Porcección de Obra Poblica Poblica Poblica Porcección de Obra Poblica Poblica Poblica Porcección de Obra Poblica Poblica Poblica Porcección de Obra Poblica Poblica Porcección de Obra Poblica Poblica Porcección de Obra Poblica Porcección de Obra Poblica Poblica Porcección de Obra Poblica Porcección de Obra Poblica Porcección de Obra Poblica Poblica Actividad Porcección de Obra Poblica Poblica Porcección de Obra Poblica Porcección de Obra Poblica Poblica Porcección de Obra Poblica Porcección de Obra Poblica Poblica Actividad Porcección de Obra Poblica Poblica Poblica Actividad Porcección de Obra Poblica Poblica Actividad Porcección de Obra Poblica Poblica Actividad Porcección de Obra Poblica Activ	Motocol Prublica Actividad processo and proc	Motocoli Protection de Obra Publica Componente de la validades para garantizar la seguridad de Motocoli Protección de Obra Portección de Obra Processo ACT-1 Se realiza la reparación de la validad proceso ACT-1 Se realiza la reparación de la validad proceso ACT-1 Se realiza la reparación de la validad proceso ACT-1 Se realiza la reparación de la validad proceso ACT-1 Se realiza la reparación de la validad proceso ACT-1 Se realiza la reparación de la validad proceso ACT-1 Se realiza la conformación de Obra de proceso ACT-1 Se realiza la conformación de Obra de parcion de Obra de Securidad de Obra de Compositor de Obra	M000001 Poblica Actividad process of the M000001 Poblica Actividad process of				

ANEXO III

TIPO DE GASTO	NO PROYECT	o in Proyecto	NIVEL DE LA	INDICADOR	CVE. ACCIÓN	I ACCIÓN VÍNCULADA	TOTAL	TOTAL ALCANZADO	PORCEN'	JUSTIFICACIÓN
	100194	Proyectos ejecutivos Diverso	Proposito	Variación porcentacual de elaboración de proyectos ejecutivos diversos		Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de proyectos ejecutivos diversos	0.00%	67.00%	0%	De manera involuntaria, se capturó avance cuando deberia di ser 0, ya que no tiene recurso asignado. No se realizo corrección en virtud de que el sistema no lo permite.
PROGRAMA DE INVERSIÓN	100210	Camina León	Actividad	Porcentaje de avance en el pago de contratos de parques lineales	B31-02	Construir 7.5 kilómetros de nuevos parques lineales, a fin de favorecer la movilidad no motorizada en los polígonos de desarrollo de Medina y San Francisco.	0.00%	33.00%	0%	De manera involuntaria, se capturó avance cuando deberia de ser O. El recurso corresponde a un contrato que está en proceso judicial; siendo necesario su disponibilidad hasta que el juicio cause estado. Cabe mencionar que ya no es posible realizar correcciones en el sistema.
	100202	Alumbra León	Actividad	Porcentaje de avance en el pago de contratos de alumbrado	A35-2	Implementar la 3a, 4a y 5a etapa del alumbrado público existente para modernizar 40,000 luminarias.	35.00%	0.00%	0%	Por el proceso de licitación se retrasó la contratación y s ejecutó en el tercer trimestre.
	100211	Muévete en bicicleta	Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de nuevas ciclovias	B32-1	Construir 25 kilómetros de nuevas ciclovías que favorezcan la conectividad con las existentes al cerrar circuitos.	50.00%	0.00%	0%	No se registró avance, puesto que no fue autorizado el recurso hasta la 11va modificación presupuestal.
